



関東甲信越まで梅雨前線が北上し、6月半ばには東北地方も梅雨入りとなりそうです。雨が続くと、土の掘削工事が遅れることとなります。雨天時で施工可能な工種を先行して進めるように、段取りを組み替えて工事を行います。雨に強い現場を目指して、安心・安全で工事を進めます。

6月～7月に行われている工事の概要

南高台造成工事

道路側溝設置及び擁壁工事を行っています。

盛土工事

防災緑地及び平場の盛土・整形を継続しています。

北高台造成工事

切盛土工事を継続しています。

排水路工事及び道路工事を行っています。

排水路工事


排水路の設置を継続しています。

橋梁工事

今月踏み掛け版の工事を行います。

道路工事

街区道路・県道の側溝及び舗装を施工しています。
県道の拡幅工事を行っています。

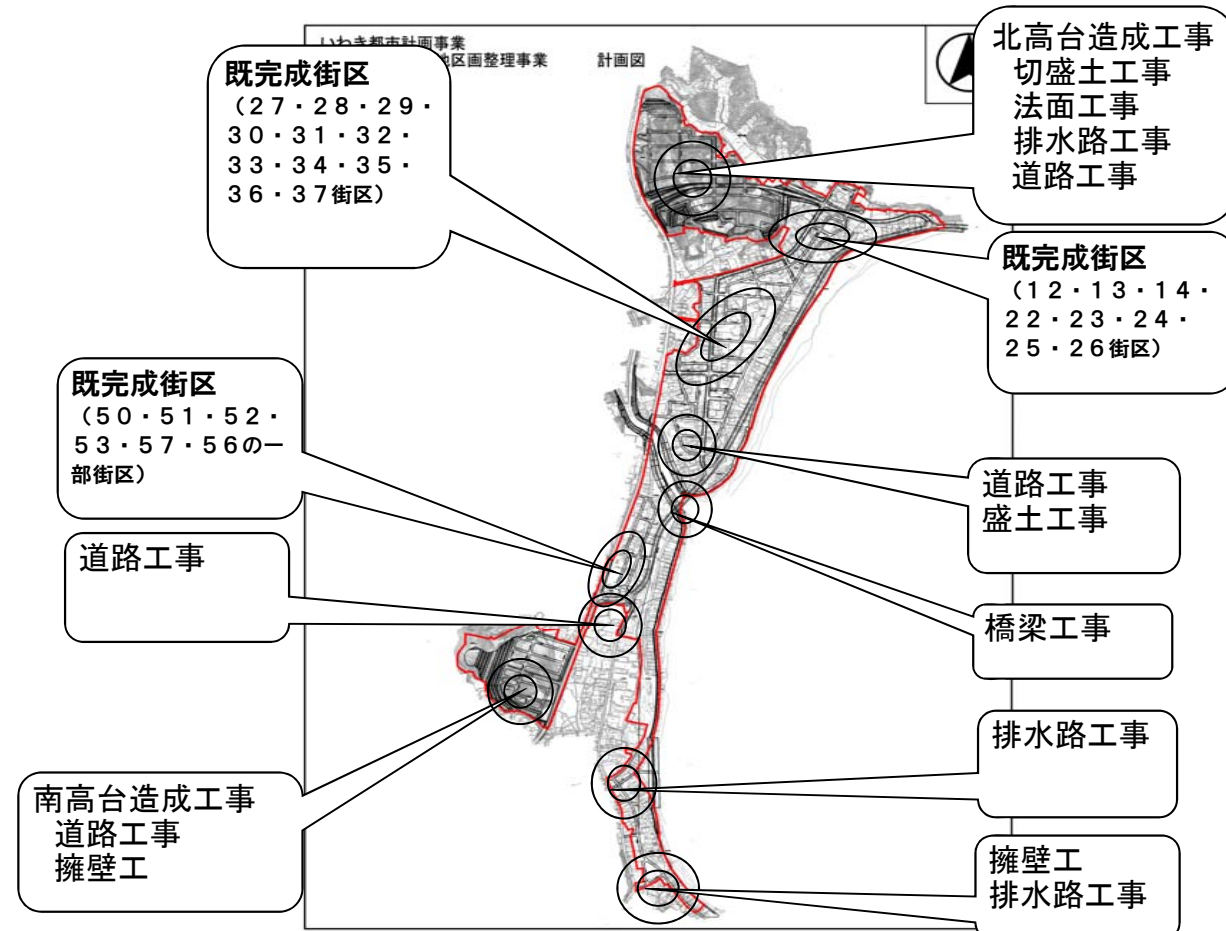

高台完成宅地

6月末に北と南の高台の一部が完成し、引渡しを行います。UR・いわき市の検査を受けた後、地権者の方に引渡されます。

南高台は工事着手当初は山頂が随分と高いところであって、背面の法が次第に下がって来るのが、工事の進捗を現場の外から確認できる場所でした。また、北高台は沢の部分が何箇所もあり、高いところを削って沢を埋める工事が敷地内部で行われていたため、災害公営住宅から工事区域の中が見通せるようになった頃には高台の部分が、ほぼ平らに仕上がっていました。

その後道路排水工事や宅盤整地工事を行い、今回の引渡しを行う準備が出来ました。満足出来る宅地が出来上がったと思います。



北高台から海側の宅地を見た風景



落石防護柵を取り除いた南高台
(手前は県道小名浜四倉線)

* 工事時間帯について *

豊間地区の工事時間帯は 7:30～18:00 となっています。

(北高台地区は 7:00～18:00 です。)

現場事務所連絡先のご案内

安藤ハザマ・五洋・西武・玉野総合・基礎地盤いわき市震災復興事業共同企業体

通称：豊間・薄磯震災復興JV

住所：いわき市平沼ノ内諏訪原1-12-5

電話：0246-98-2610

責任者：最上 登久也(モガミ トクヤ)

渉外担当：大橋 正英
